





<https://edraw.wondershare.cn/mindmaster/>

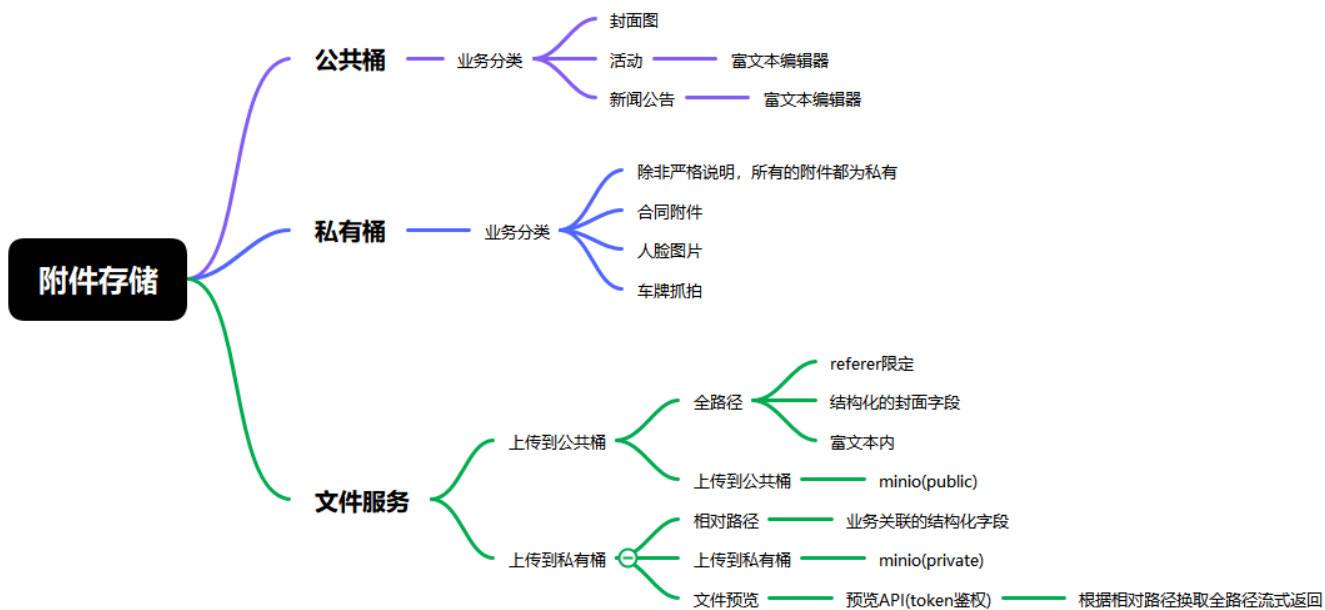

project

<https://edraw.wondershare.cn/edrawproject/>

WBS	任务	开始时间	完成时间	工期	前置任务	进度	状态	优先级	资源
3	2.1 一、项目背景调研	2024-01-01	2024-01-15	11工作日		88.6%	已延迟	2	项目经理, 产品经理
4	2.1.1 分析市场需求和竞争情况	2024-01-01	2024-01-03	3工作日		100%	已完成	3	项目经理, 产品经理
5	2.1.2 确定项目目标和范围	2024-01-04	2024-01-08	3工作日	4FS	100%	已完成	4	项目经理, 产品经理
6	2.1.3 制定项目计划和时间表	2024-01-09	2024-01-15	5工作日	5FS	75%	已延迟	5	项目经理, 产品经理
7	2.2 二、项目资源准备	2024-01-11	2024-01-29	13工作日		63.5%	进行中	1	项目经理
8	2.2.1 确定项目团队成员	2024-01-11	2024-01-16	4工作日		100%	已完成	2	项目经理
9	2.2.2 分配项目角色和职责	2024-01-17	2024-01-22	4工作日	8FS	75%	已暂停	3	项目经理
10	2.2.3 确定项目所需的硬件和软件资源	2024-01-23	2024-01-29	5工作日	9FS	25%	已暂停	4	项目经理
11	2.3 三、项目风险评估	2024-01-19	2024-02-06	13工作日		30.8%	已延迟	5	项目经理
12	2.3.1 识别项目风险	2024-01-19	2024-01-24	4工作日		100%	已完成	2	项目经理
13	2.3.2 评估风险的概率和影响	2024-01-25	2024-01-31	5工作日	12FS	0%	已暂停	3	项目经理
14	2.3.3 制定风险应对策略	2024-02-01	2024-02-06	4工作日	13FS	0%	已延迟		项目经理
15	3 第二阶段——需求分析	2024-02-02	2024-02-27	18工作日		0%	已延迟		产品经理
16	3.1 一、收集用户需求	2024-02-02	2024-02-09	6工作日		0%	已延迟		产品经理
17	3.1.1 分析用户需求	2024-02-02	2024-02-06	3工作日		0%	已延迟		产品经理

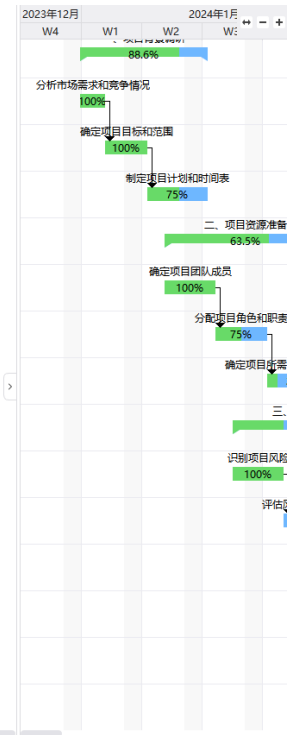

<https://edraw.wondershare.cn/edrawboard/>

visio

<https://edraw.wondershare.cn/edrawmax/>

#5

24 2025 08:24:59

29 2026 16:40:23
